

別添 5-1 アスベスト事前調査結果（教職員住宅）

※市が別途発注したアスベスト定性分析調査委託の結果報告書から抜粋

5. 分析結果

試料 No. N2510	採取場所	建材名称	偏光顕微鏡による 定性分析結果			別添 データ No.
			石綿の 有無と種類		推定石 綿質量 分率	
0531	①屋根	シンダーコンクリート下 アスファルト防水	無	—	—	1
0532	②屋根 目地	エキスパンション目地 アスファルト系コーキング	有	Chr	0.1-5%	2
0533	③屋根 笠木	防水モルタル金ゴテ仕上げ	無	—	—	3
0534	④サッシまわり	油性コーキング	有	Chr	0.1-5%	4
0535	⑤外壁	モルタル刷毛引きリシン仕上げ	無	—	—	5
0536	⑥外壁改修部	モルタル刷毛引きリシン仕上げ	無	—	—	6
0537	⑦103 号室 玄関 幅木	ラワン材 OP 塗	有	Chr	0.1-5%	7
0538	⑧103 号室 玄関 壁	化粧フレキシブルボード	有	Chr	5-50%	8
0539	⑨103 号室 玄関 天井	ジプトーン	有	Chr	0.1-5%	9
0540	⑩101 号室 台所 床	フロアパネル	無	—	—	10
0541	⑪102 号室 台所 床②	フロアパネル	無	—	—	11
0542	⑫103 号室 台所 床	フロアパネル	有	Chr	0.1-5%	12
0543	⑬201 号室 台所 床	フロアパネル	無	—	—	13
0544	⑭203 号室 台所 床	フロアパネル	有	Chr	0.1-5%	14
0545	⑮201 号室 台所 腰壁	タイル貼り	無	—	—	15
0546	⑯201 号室 和室(東) 壁	繊維壁	無	—	—	16
0547	⑰201 号室 和室(東) 壁改修部	繊維壁	無	—	—	17
0548	⑱201 号室 和室(西) 壁	繊維壁	無	—	—	18
備考						
※ 0537：塗材から検出						
※ 0542, 0544：接着剤から検出						

注 1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

注 2) 推定石綿質量分率の報告区分については JIS A 1481-1 を参照のこと。

注 3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が 1 本又は 2 本だけ検出されたことを示す。

注 1) 石綿の種類・の項目には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクトノライト Ant:アンソフィライト

注 2) 推定石綿質量分率の報告区分については JIS A 1481-1 を参照のこと。

注 3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が 1 本又は 2 本だけ検出されたことを示す。

サンプリング箇所配置図

豊田市旧教職員上郷住宅



101号

102号

103号

【1階平面図】

⑦: N25100537	⑦103号室	玄関	幅木	ラワン材OP塗
⑧: N25100538	⑧103号室	玄関	壁	化粧フレキシブルボード
⑨: N25100539	⑨103号室	玄関	天井	ジブトーン
⑩: N25100540	⑩101号室	台所	床	フロアパネル
⑪: N25100541	⑪102号室	台所	床②	フロアパネル
⑫: N25100542	⑫103号室	台所	床	フロアパネル

豊田市旧教職員上郷住宅



201号


202号

203号


【2階平面図】

⑬: N25100543	⑬201号室 台所	床	フロアパネル	⑲: N25100549	⑲201号室 和室(西)	壁改修部	繊維壁
⑭: N25100544	⑭203号室 台所	床	フロアパネル	⑳: N25100550	⑳201号室 便所	床	モザイクタイル貼り
⑮: N25100545	⑮201号室 台所	腰壁	タイル貼り	㉑: N25100551	㉑201号室 便所	腰壁	75角タイル貼り
⑯: N25100546	⑯201号室 和室(東)	壁	繊維壁	㉒: N25100552	㉒201号室 便所	壁	プラスチック塗り
⑰: N25100547	⑰201号室 和室(東)	壁改修部	繊維壁	㉓: N25100553	㉓201号室 便所	天井	石膏ボードEP塗り
⑱: N25100548	⑱201号室 和室(西)	壁	繊維壁	㉔: N25100554	㉔201号室 浴室	壁	パーライト掻き落とし


豊田市旧教職員上郷住宅

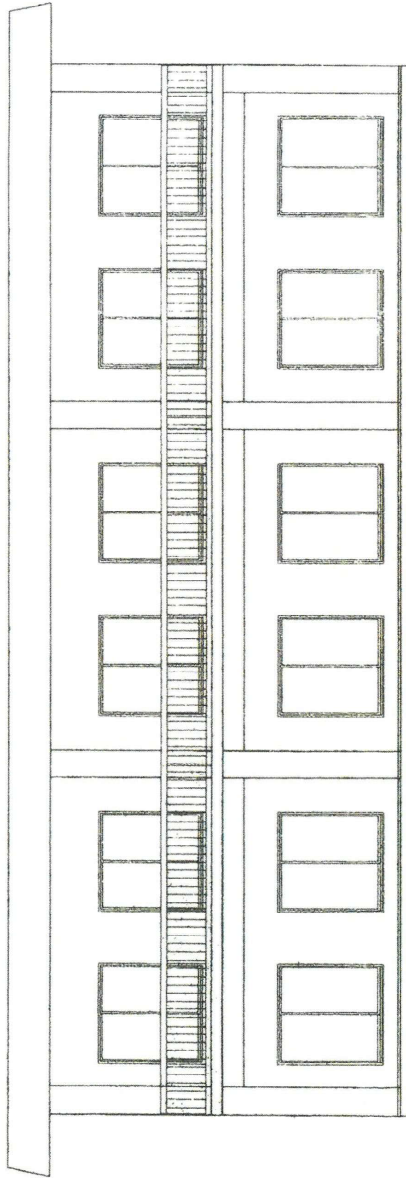


【南立面図】

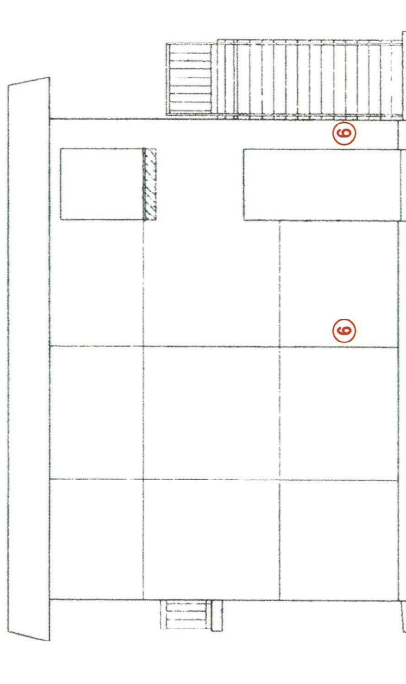

【東立面図】

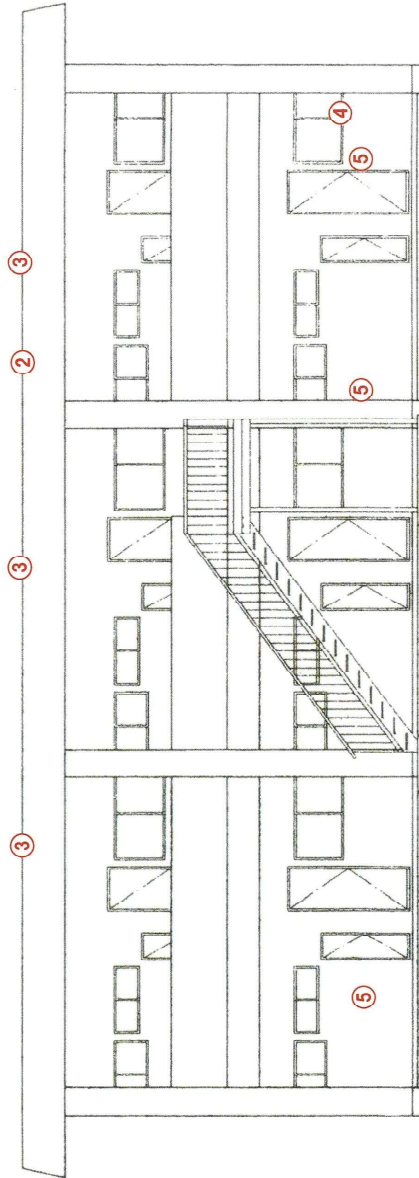

【北立面図】

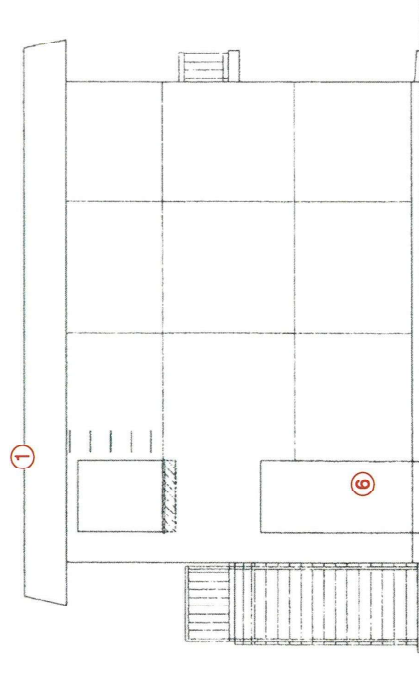

【西立面図】

- | | | |
|---------------|----------|------------------------|
| ① : N25'00531 | ① 屋根 | シンダーコンクリート下アスファルト防水 |
| ② : N25'00532 | ② 屋根 | エキスパンション目地アスファルト系コーキング |
| ③ : N25'00533 | ③ 屋根 | 防水モルタル金ゴテ仕上げ |
| ④ : N25'00534 | ④ サッシまわり | 油性コーキング |
| ⑤ : N25'00535 | ⑤ 外壁 | モルタル刷毛引きリシン仕上げ |
| ⑥ : N25'00536 | ⑥ 外壁改修部 | モルタル刷毛引きリシン仕上げ |
